# Contract Time Estimate

**Rd:** IH 635 **County:** Dallas

**CSJ:** 2374-02-156 **Project:** F 2021(732)

= # Days / Cell

| TASK # | Description | Quantity | Unit | Daily Rate | Duration | Pred Task | % Compl | Pred Task | % Compl | Pred Task | % Compl | Start Day | Finish Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Initial TCP/Mobility | 1 | LS | 0.25 | 4 | | | | | | | 1 | 4 |
| 2 | Full Depth Concrete Repair | 3,580 | SY | 90 | 40 | 1 | 100 | | | | | 5 | 44 |
| 3 | Flex. Pvmnt. Repair/Shoulders | 1,959 | SY | 70 | 28 | 2 | 50 | | | | | 25 | 52 |
| 4 | Joint Repair | 1,434 | LF | 150 | 10 | 3 | 100 | | | | | 53 | 62 |
| 5 | Mill HMA | 502,187 | SY | 4040 | 125 | 4 | 100 | | | | | 63 | 187 |
| 6 | Inlay SMA | 62,146 | TON | 500 | 125 | 4 | 100 | | | | | 63 | 187 |
| 7 | Pavement Markings | 201,159 | LF | 10000 | 21 | 6 | 100 | | | | | 188 | 208 |
| 8 | Project Clean up | 317 | STA | 50 | 7 | 7 | 100 | | | | | 209 | 215 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |

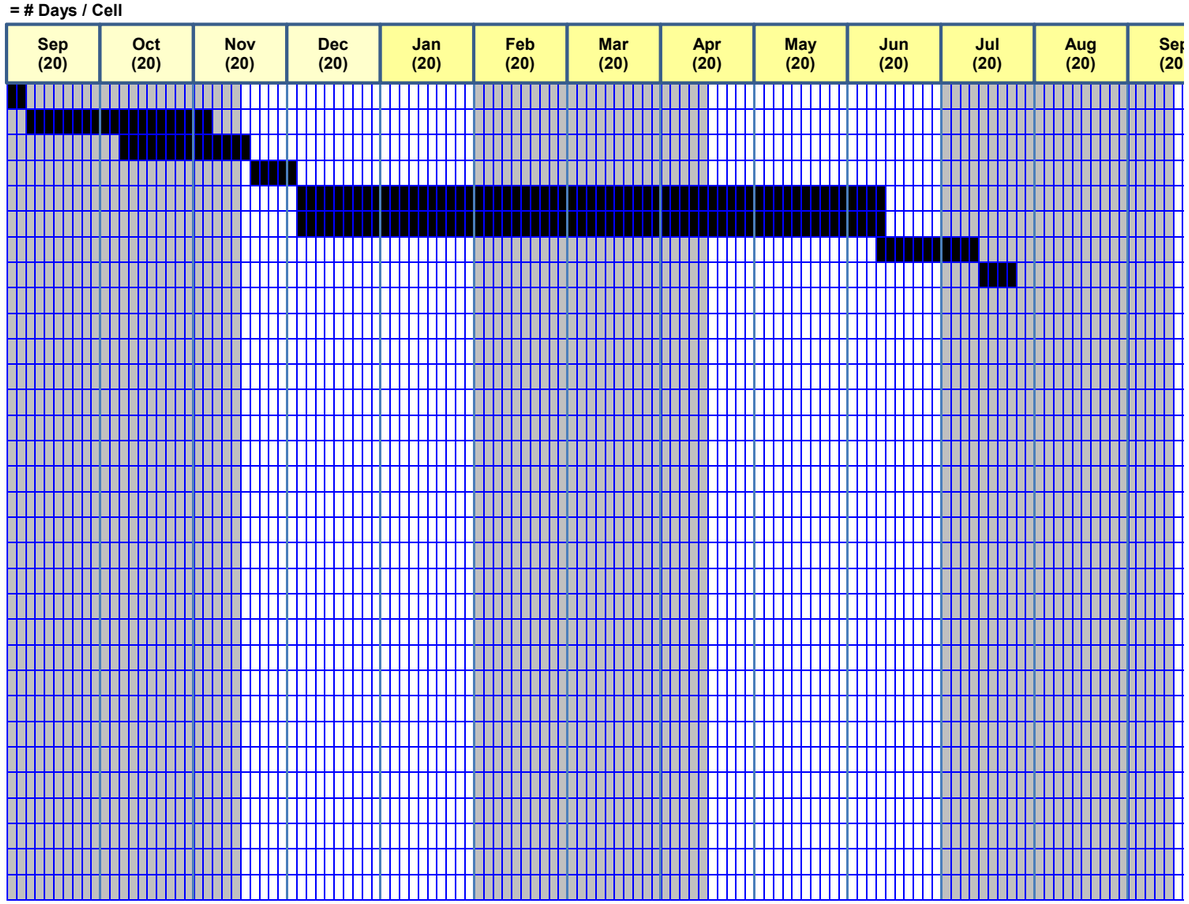


*Number of Working Days:* = 215

*Total Number of Working Days* *215* x 1.00= 215

*Standard Work Week:* (215X1.22)/21= 12.5

*Number of Months for Barricades:* = **13**

solomonbayou , 5/27/21

*Signature* *Date*

Construction Begin: 9/1/2021

Construction End:9/1/2022

A Standard Working Week
