Rd: US 82 **County:** MONTAGUE

CSJ: 0044-04-048, ETC **Project:**

TASK #	Description	Quantity	Unit	Daily Rate	Duration	Pred Task	% Comp	Pred Task	% Comp	Pred Task	% Comp	Start Day	Finish Day
1	Mobilization	1	LS	0.1	10							1	10
2	Initial Setup TCP	1	LS	1	1	1	100					11	11
3	Preparation of ROW	150	STA	10	15	2	100					12	26
4	Erosion Control Plan	9,164	LF	500	19	3	25					16	34
5	Excavation	172,906	CY	2000	87	4	100					35	121
6	Embankmanet	91,840	CY	1500	62	5	50					79	140
7	Riprap (Conc)	1,398	CY	40	35	6	75					126	160
8	DRILL SHAFT	1,225	LF	100	13	6	75					126	138
9	CL C CONC (COLUMN)(HPC)	50	CY	20	3	8	100					139	141
10	CEM STABIL BKFL	394	CY	80	5	9	100					142	146
11	CL C CONC (ABUT)(HPC)	174	CY	25	7	9	100					142	148
12	CL C CONC (CAP)(HPC)	64	CY	20	4	9	100					142	145
13	PRES CONC GRDR (TX28)	695	LF	250	3	12	100					146	148
14	PRES CONC GRDR (TX46)	2,618	LF	250	11	12	100					146	156
15	REINF CONC SLAB (HPC)	44,582	SF	6000	8	14	100					157	164
16	APPROACH SLAB (HPC)	270	CY	30	9	15	100					165	173
17	RAIL (TY SSTR) (W/DRAIN)	328	LF	100	4	16	100					174	177
18	RAIL (TY SSTR)	832	LF	100	9	16	100					174	182
19	Riprap (Stone)	912	CY	25	37	11	100					149	185
20	SEALED EXPANSION JOINT	286	LF	100	3	16	100					174	176
21	TRENCH EXCA PROTEC	3,449	LF	50	69	5	80					105	173
22	TEMPORARY SPL SHORING	345	SF	75	5	5	80					105	109
23	Remove Small STR	15	EA	1	15	21	100					174	188
24	Concrete Box Culvert	2,047	LF	50	41	22	100					110	150
25	Wingwall	12	EA	0.5	24	24	50					131	154
26	RC Pipe	4,083	LF	96	43	22	100					110	152
27	SET	33	EA	4	9	26	50					132	140
28	Inlet & Manhole	34	EA	0.5	68	26	90					149	216
29	Cement Treated Subgrade	93,128	SY	10000	10	28	100					217	226
30	Flexible Base	100,261	SY	1000	101	29	25					220	320
31	Stone Matrix	16,212	TON	500	33	30	30					251	283
32	ACP	34,532	TON	1000	35	31	50					268	302
33	Driveway	1,792	SY	200	9	32	80					296	304
34	Remove Large STR	1	EA	0.1	10	32	100					303	312
35	MBGF	1,989	LF	300	7	32	100					303	309
36	Remove and Install Small Sign	137	EA	10	14	35	100					310	323
37	Traffic Control	2	LS	0.1	20	36	100					324	343
38	Level Up	61,776	TON	700	89	37	100					344	432
39	Striping	131,870	LF	5000	27	38	75					411	437
40	Seeding	254,650	SY	40000	7	39	100					438	444
41	Vegetative Watering	4,278	MG	100	43	39	100					438	480
42	Cleanup and Finalize	1	LS	0.1	10	40	100					445	454

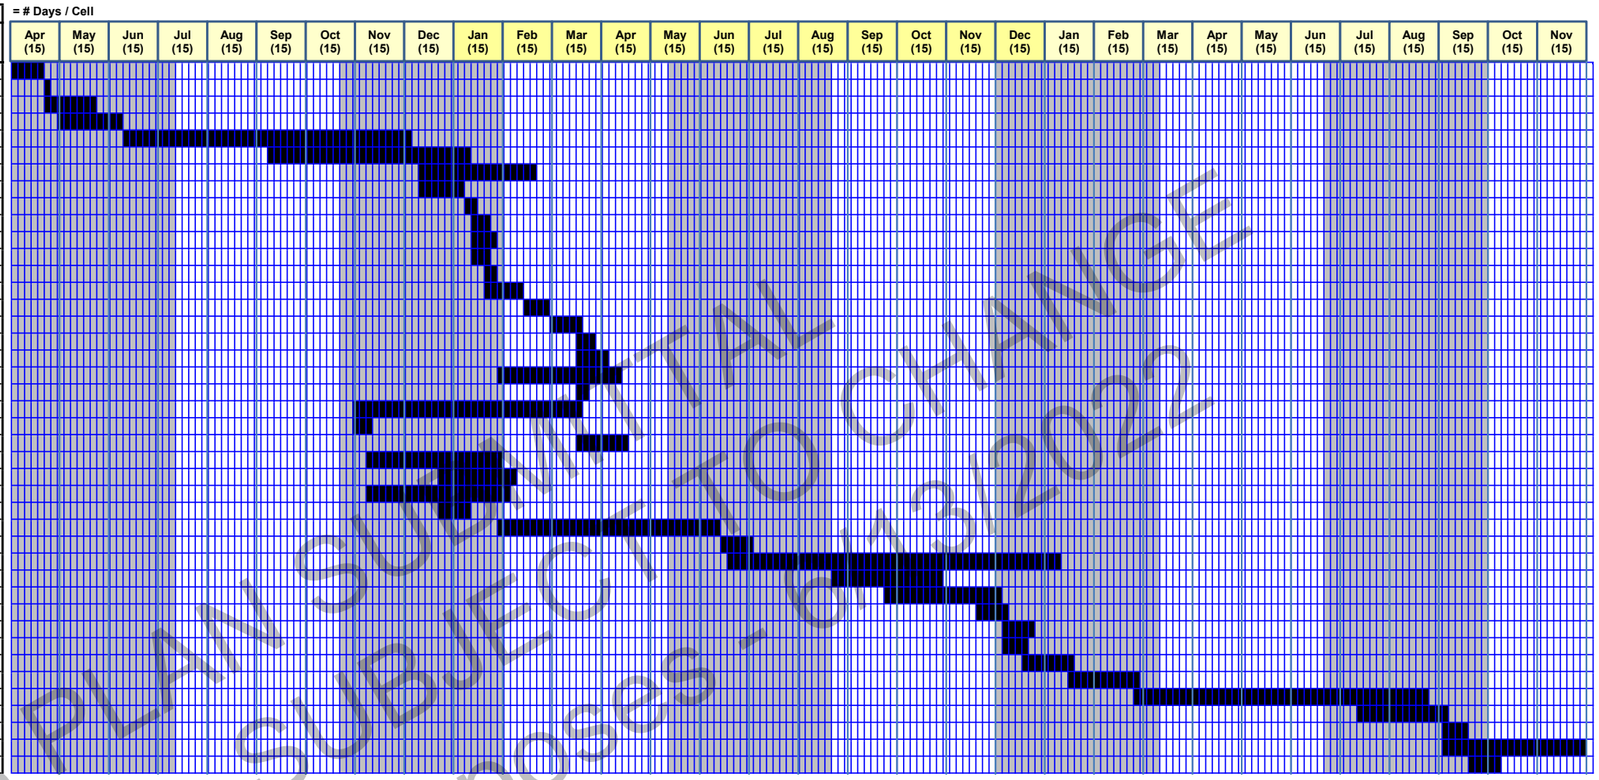

90% PLANS SUBMITTAL
PRELIMINARY - SUBJECT TO CHANGE
Not for bidding purposes
